Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE DEMOKRATİK YEREL YÖNETİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SİVİL KATILIMIN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ



Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

İÇERİK

09:30 - 10:40

GENEL PDY BİLGİLENDİRMESİ

HİBE PROGRAMI

ARKA PLAN VE ANALİZLER

10:40 – 10:50

ARA

10:50 – 12:30

BÜTÇE

MANTIKSAL ÇERÇEVE

BAŞVURU FORMU



Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

PROJE NEDİR?

«Proje, özellikleri tanımlanmış amacı gerçekleştirmek için, sınırlı kaynaklar kullanarak, başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmiş çalışmaların koordine edildiği ve denetlendiği özgün bir süreçtir.»

«Proje; özgün bir ürün veya hizmet üretmek için gösterilen geçici bir çabadır.»

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

KAPSAM

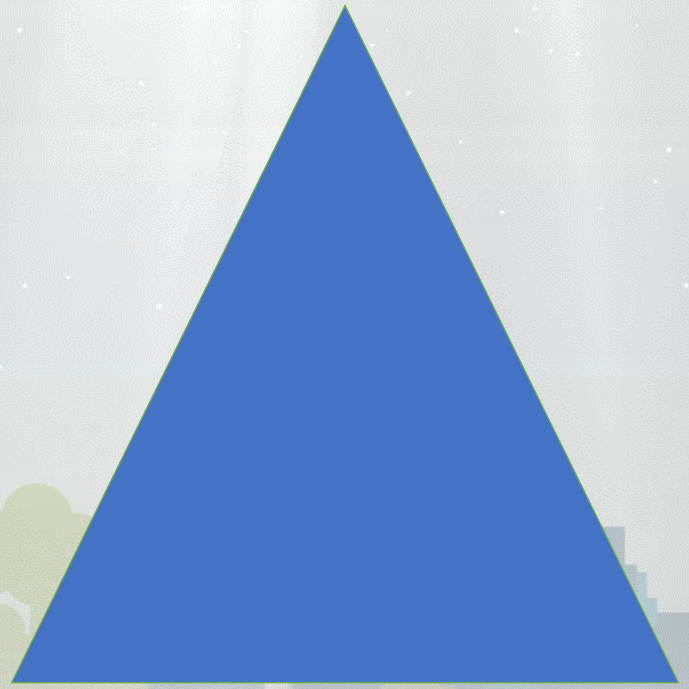

BÜTÇE

ZAMAN

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

POLİTİKA / PORTFÖY

Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim

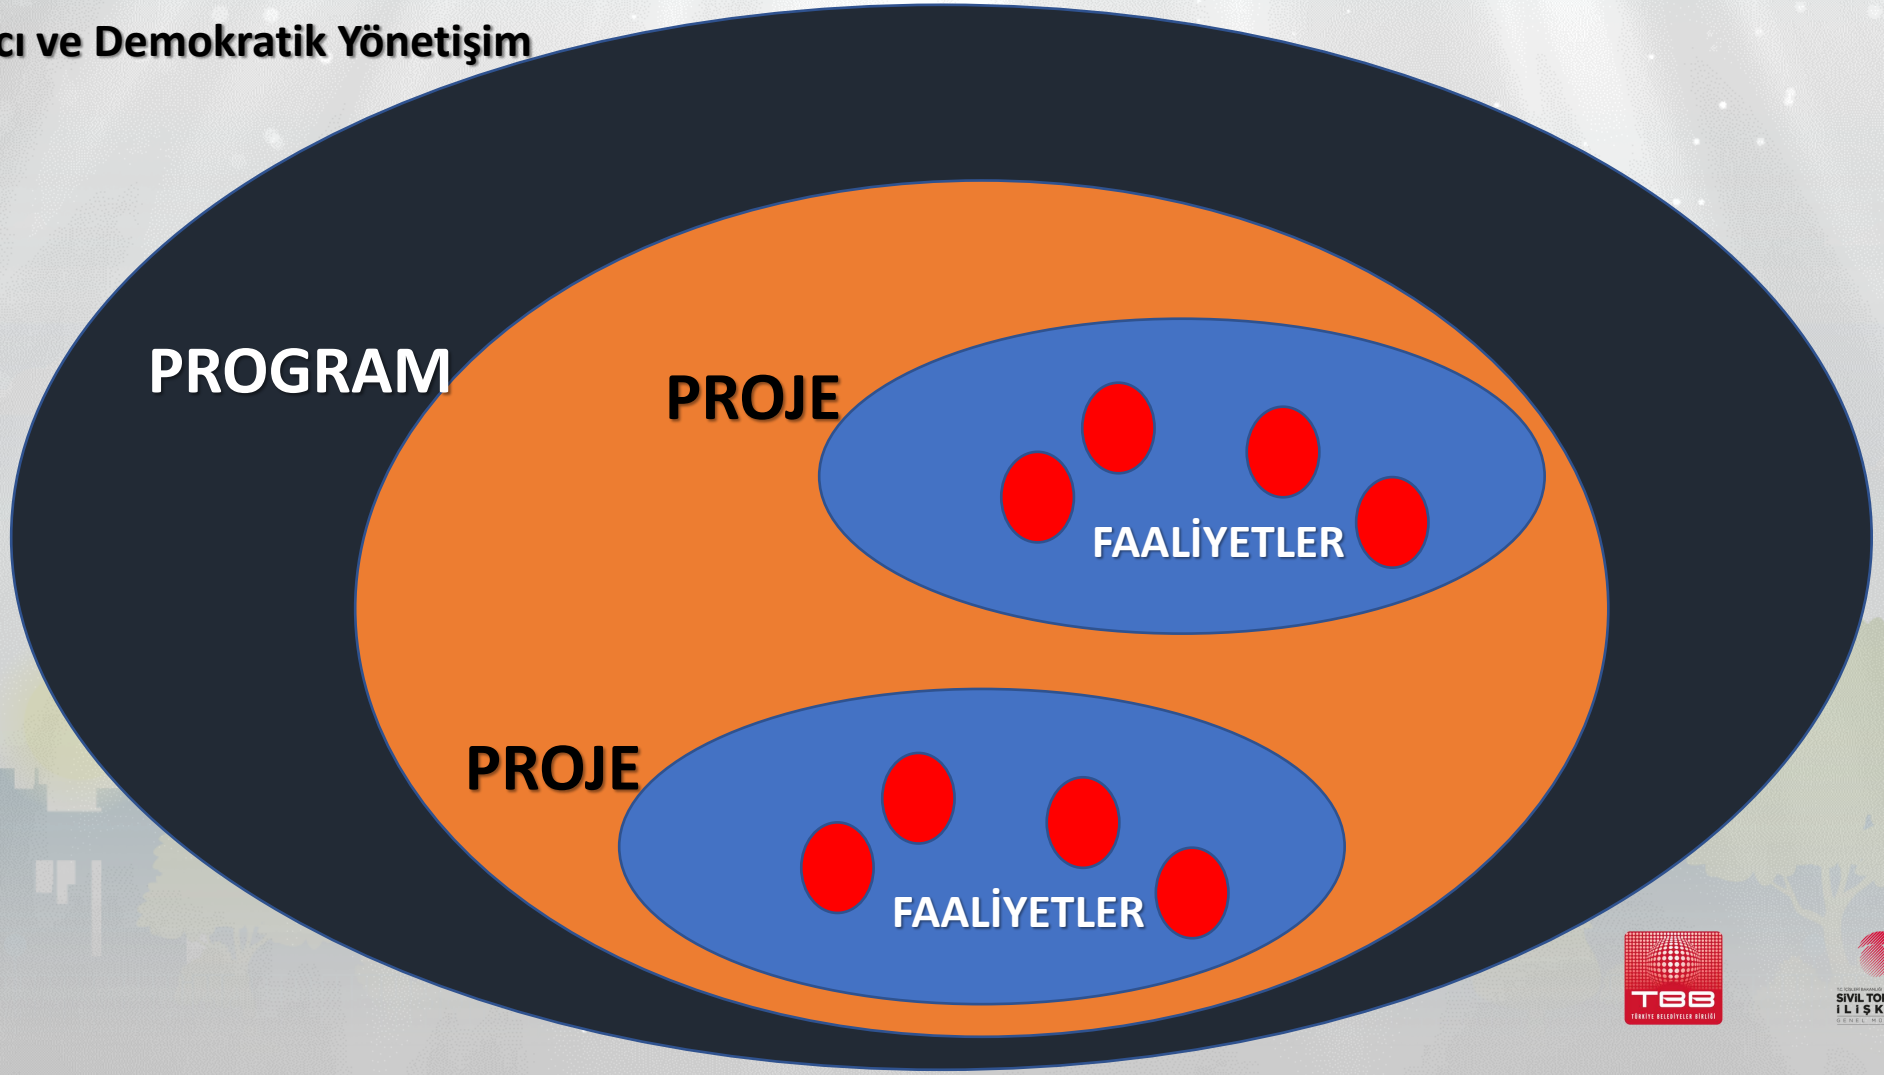

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

(STK) Kurumsal İhtiyaçlarımız / Hedeflerimiz

Programın İhtiyaçları / Hedefleri

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Proje Fikri;

- Öncelik alanlarımıza uygun mu?
- Taleplerimizi karşılıyor mu?
- Beklediğimiz etkiyi yaratıyor mu?
- Gerçekçi mi?



Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Kendinizi fon sağlayan kurumun yerine koyun!!!

FON SAĞLAYAN KURUM NE İSTİYOR?

BAKILACAK ADRES: TEKLİF ÇAĞRISI

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR 2
1. GİRİŞ 5
1.1. Arka Plan 5
1.2. "Türkiye'de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi" Projesi 6
2. SİVİL KATILIM HİBE PROGRAMI 8
2.1. Sivil Katılım Hibe Programının Hedefleri ve Öncelik Alanları 8
2.2. Sivil Katılım Hibe Programı Kapsamında Sağlanacak Mali Destek 9
3. SİVİL KATILIM HİBE PROGRAMI UYGUNLUK KRİTERLERİ 11
3.1. Başvuru Sahibinin Uygunluğu 11
3.2. Projenin Uygunluğu 15
3.3. Maliyetlerin Uygunluğu 19
4. PROJELERİN HAZIRLANMASINDA KULLANILABİLECEK İZLEMEYE ESAS PERFORMANS GÖSTERGELERİ 21
5. PROJE BİLGİLENDİRME, BAŞVURU, DEĞERLENDİRME ve SEÇİM SÜRECİ 21
5.1. Bilgilendirme Süreci 22
5.2. Başvuru Süreci 23
5.3. Başvuruların İçeriği 23
5.4. Projelerin Değerlendirme ve Seçim Süreci 24
5.5. Başvurunun Reddi 28
5.6. Seçilen Proje Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 28
6. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI 29
7. SÖZLEŞMEDE YER ALAN YÜKÜMLÜLÜKLER 30
8. GÖSTERGE NİTELİĞİNDE SİVİL KATILIM HİBE PROGRAMI TAKVİMİ 33
9. EKLER 34

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Sivil Katılım Hibe Programı; kamu-sivil toplum işbirliğini desteklemek üzere bir kapasite geliştirme aracı olarak tasarlanmıştır. Program ile sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimler ve diğer yerel aktörlerle işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Detaylar için; Hibe Programı Tanıtım Sunumu

https://www.sivilkatilim.org.tr/hibe-programi-tanitim-sunumu/

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Proje Analizi

Proje Planlaması

Proje Yazımı

%70 – 80

%20 – 30

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum eylemleri yoluyla iklim değişikliğinin etkilerine karşı savunmasız olan nüfusların ve ekonomik sektörlerin kapasitesini ve dayanıklılığını geliştirmek ve düşük karbonlu ve iklime dirençli kalkınmayı desteklemek

STK'ların ve yerel yönetimlerin doğal ve beşeri afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme kapasitelerini geliştirmek, şehirleri ve toplumu dirençli hale getirmek

Sosyo-ekonomik kalkınmayı ve sivil katılım mekanizmalarını desteklemek üzere, kadınların, gençlerin, çocukların, depremzedelerin ve dezavantajlı grupların güçlendirilerek karar alma mekanizmalarına ve uygulamaya katılımını sağlamak ve gönüllülüğü arttırmak

STK'lar ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğini güçlendirmek için yeni teknolojilerin ve bilginin kullanımını teşvik etmek, mevcut sivil toplum kuruluşu merkezlerinin kapasitelerini güçlendirmek, yeni merkezlerin kurulmasını sağlamak

TBB Türkiye Belediyeler Birliği

T.C. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı
Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs

UNDP

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

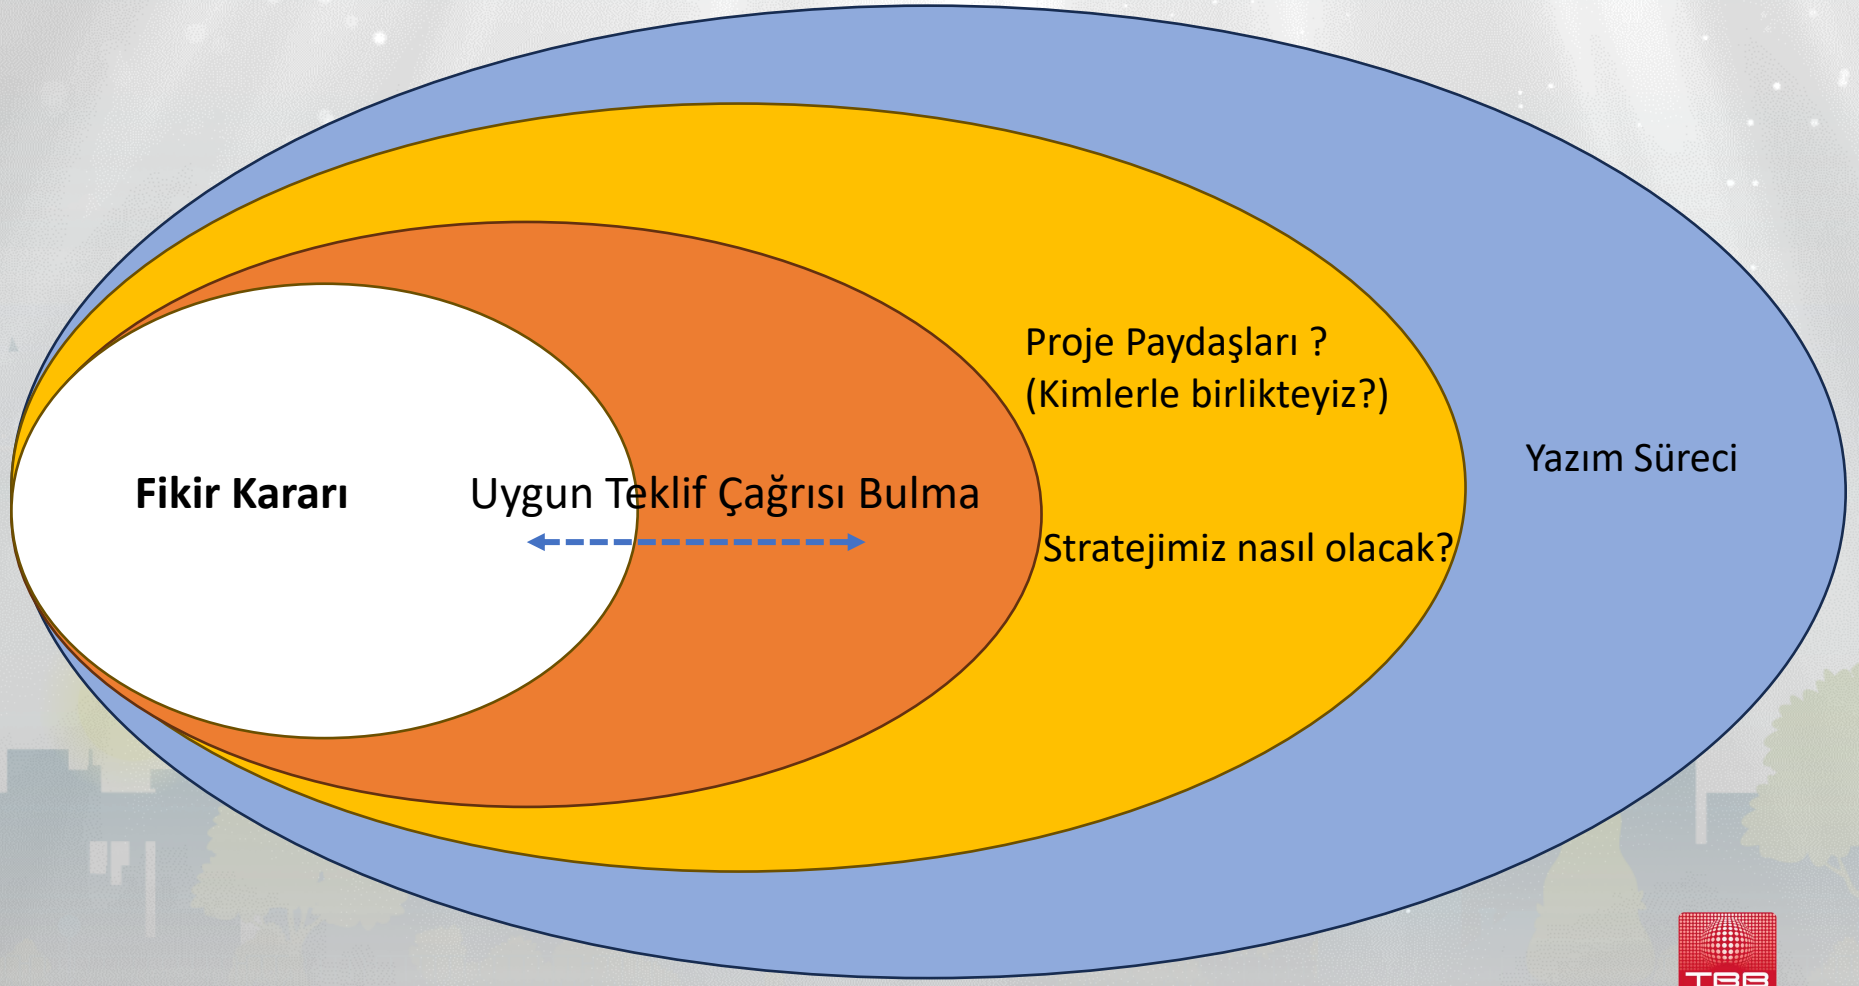



Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Projenin Odağında Ne var?

- Ürün Odaklı mı?
- Hizmet Odaklı mı?
- Ürün + Hizmet Odaklı mı?

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Fikir bulundu mu?

İlgili Bakanlıkların raporları

Tüzük, rapor, yayın vb. sizin belgeleriniz

AB süreci ile ilgili dokümanları (ilerleme raporları, strateji belgeleri)

ARKA PLAN İLGİSİ!!!

UNDP konu ve sektör ile ilgili belgeleri

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Bölge planları

Sivil Katılım Belgeleri

Kalkınma Belgeleri

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Fikir bulundu mu?

Halen bulmakta zorluk çekiyorsanız;

* STK'yı kurma amaçlarınızı düşünebilirsiniz. (STK'yı güçlendirmek değil, işbirliği...)

* Yerel yönetimlerin çalışma alanlarındaki ihtiyaç duyduğunuz değişiklik olabilir.

* Çalışma alanınızla ilgili zaman zaman dile getirdiğiniz problemler olabilir.

* Çeşitli toplantılarda dile getirilmiş başlıklar olabilir.

* İlgili sektördeki akademik makalelerde konu ile ilgili tespit edilmiş problemler olabilir.

Konu ne olursa olsun, STK kuruluş amacınız ile ilgili olmalıdır.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Proje Analizi

1. Mevcut Durum Analizi
2. Sorun Analizi
3. Paydaş Analizi
4. Hedef Analizi
5. Strateji Analizi

Proje Planlaması

1. Faaliyetlerin Planlanması
2. Bütçenin Planlanması
3. Mantıksal Çerçevenin Planlanması

Proje Yazımı

1. Başvuru Formunun Doldurulması
2. Ek Belgelerin Hazırlanması
3. Başvurunun Sunulması

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Proje Analizi

Proje Planlaması

Proje Yazımı

%70 – 80

%20 – 30

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

AKLIMIZA BİR FİKİR GELDİ, PEKİ SONRA?

SORUN ANALİZİ

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Bir ağaç resmi çizer misiniz?

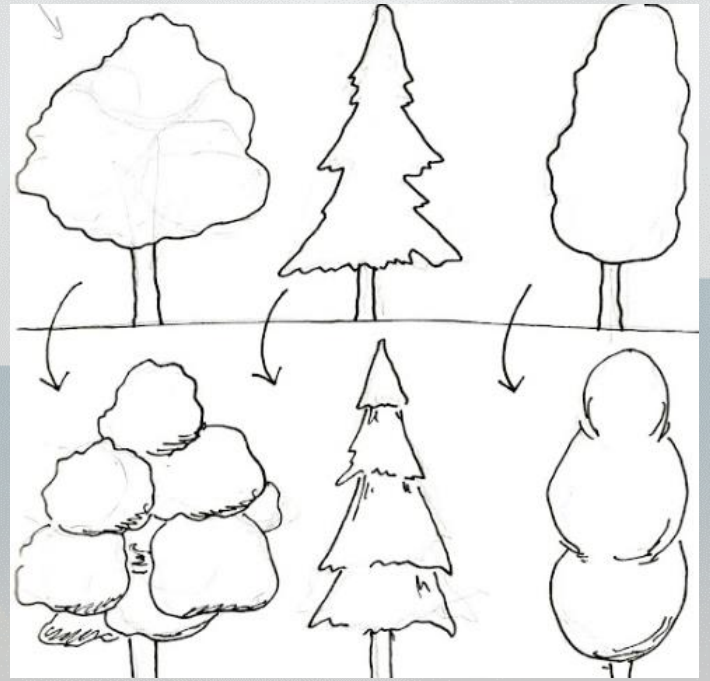

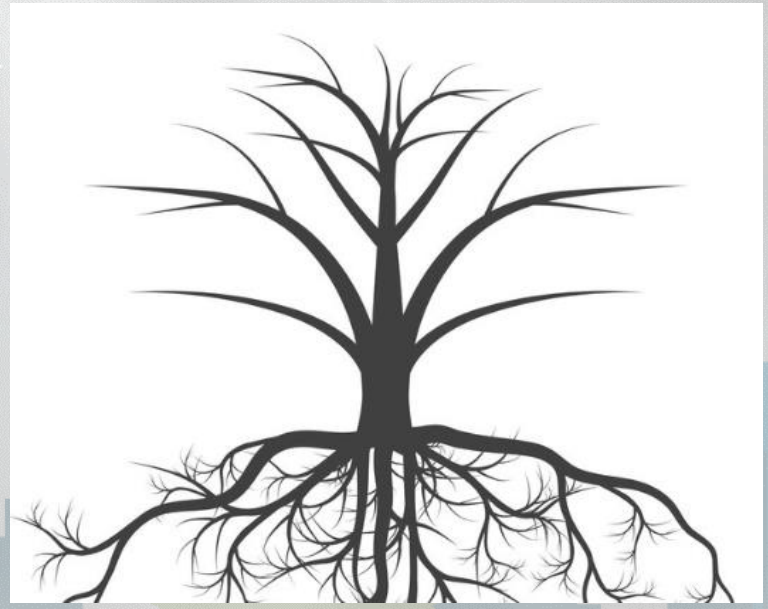

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

«Sorunu kökünden halletmek»

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

ANA PROBLEM

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

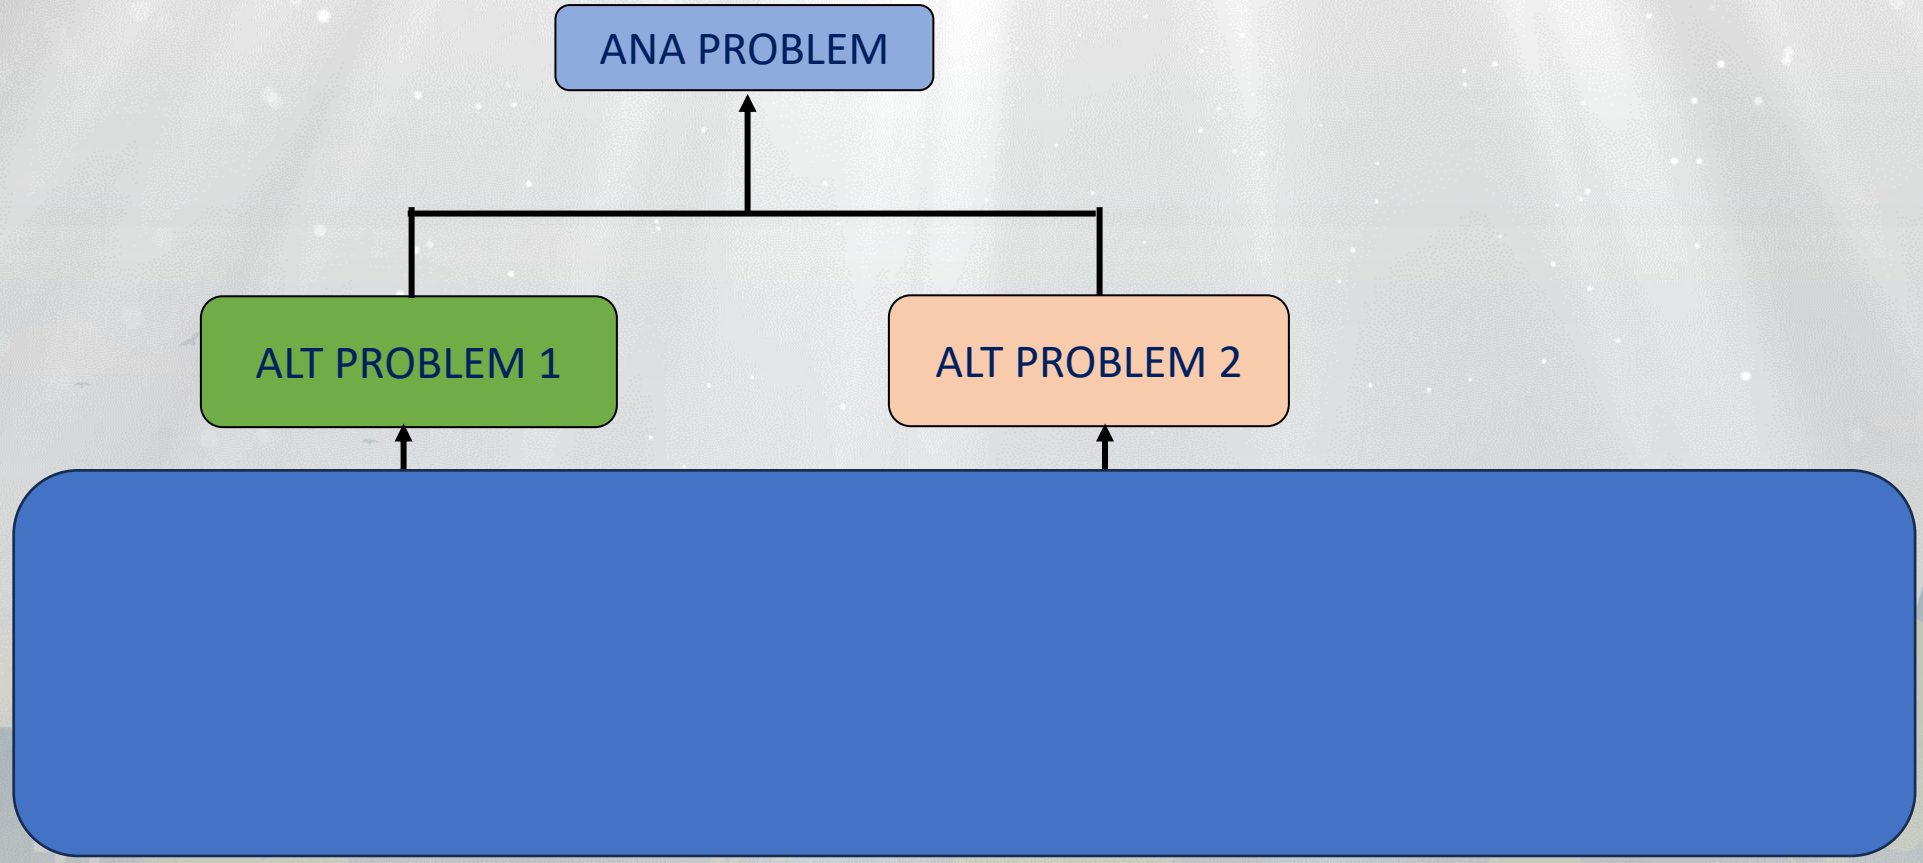

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

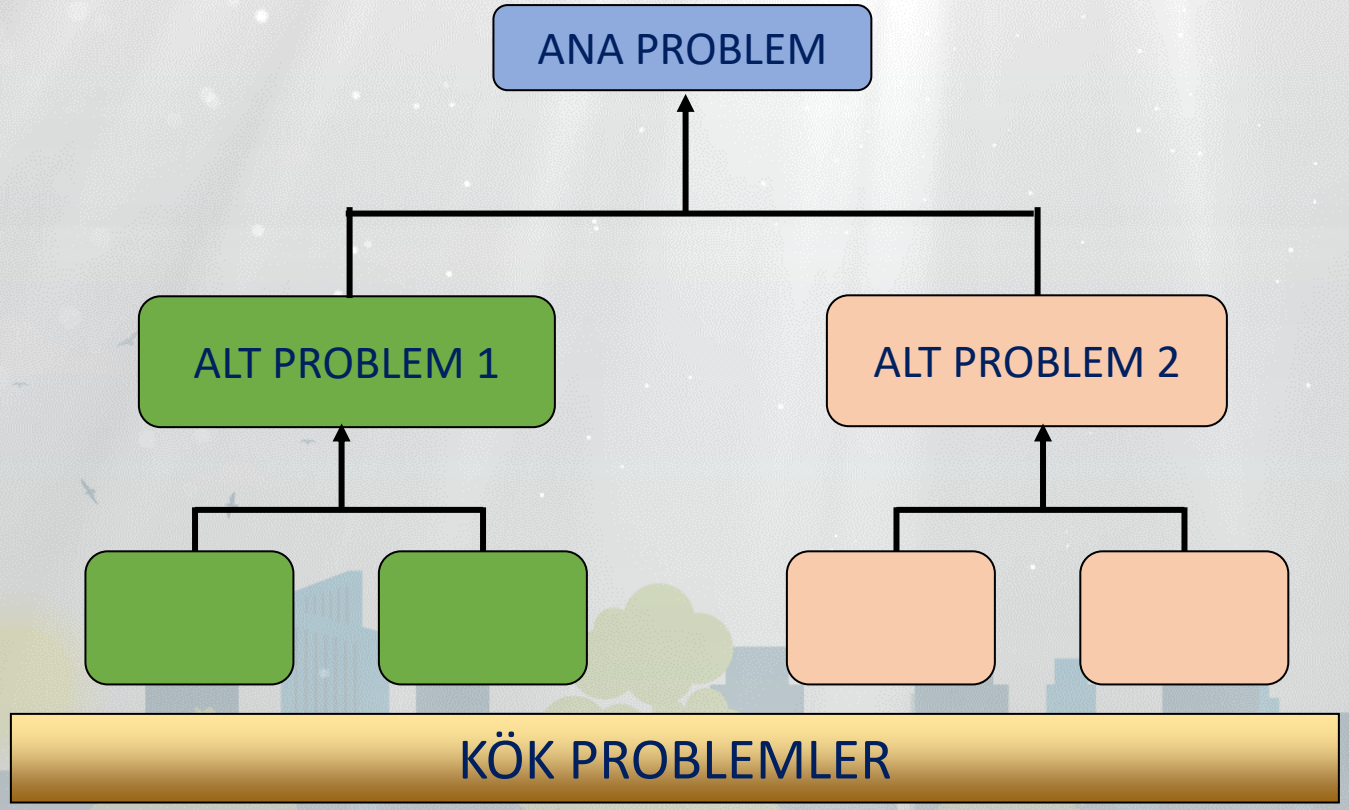

SONUÇLAR

NEDENLER

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

SONUÇLAR

NEDENLER

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

SONUÇLAR

NEDENLER

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

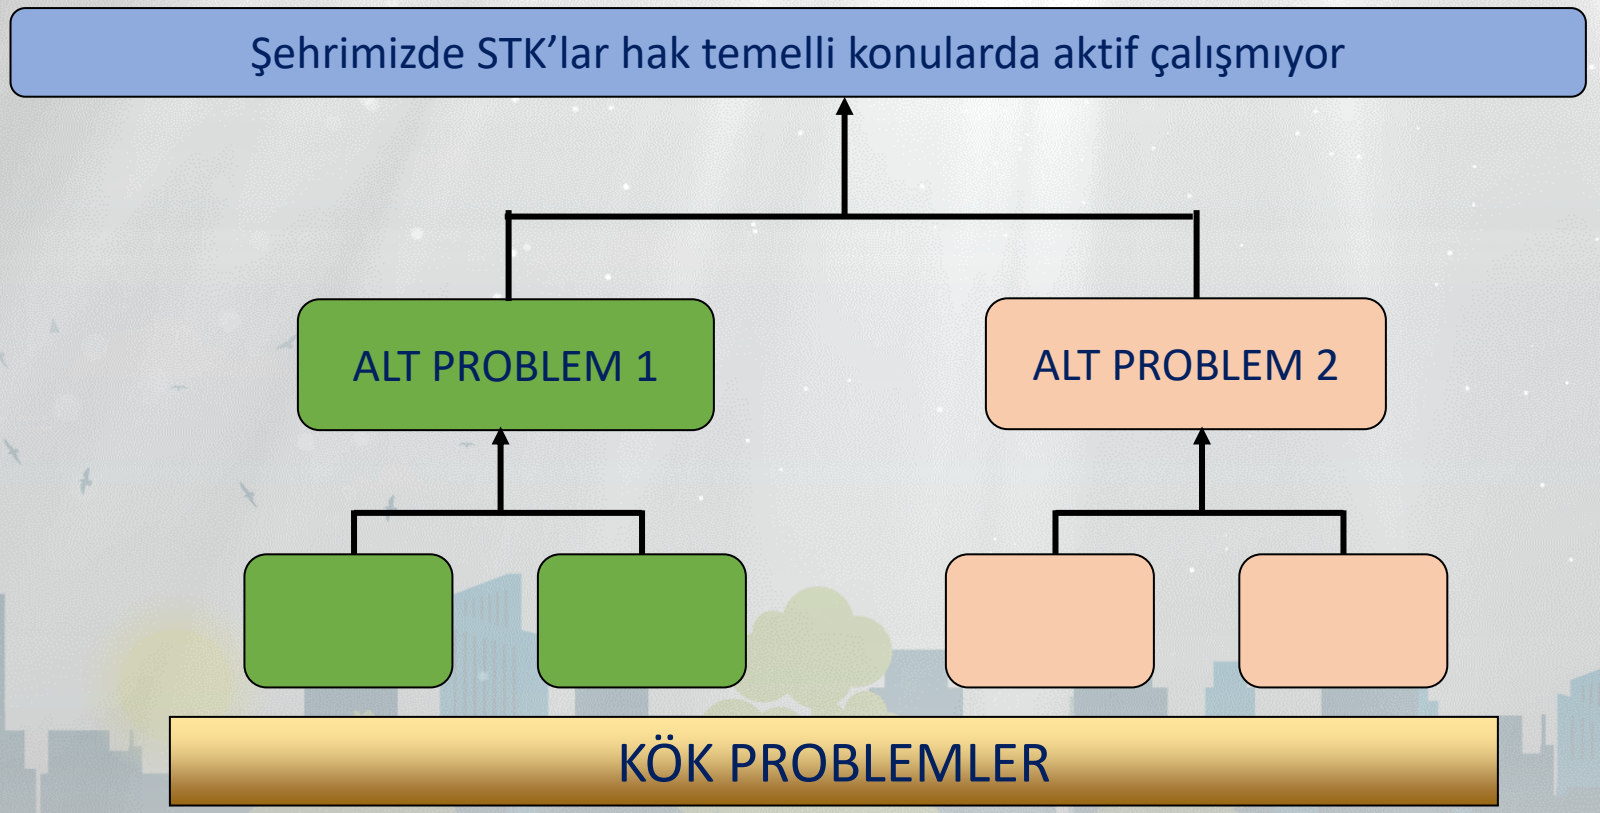

SONUÇLAR

NEDENLER

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

SONUÇLAR

Özel yetenekli öğrenciler erken yaşta sistematik ve planlı bir şekilde tespit edilmiyor

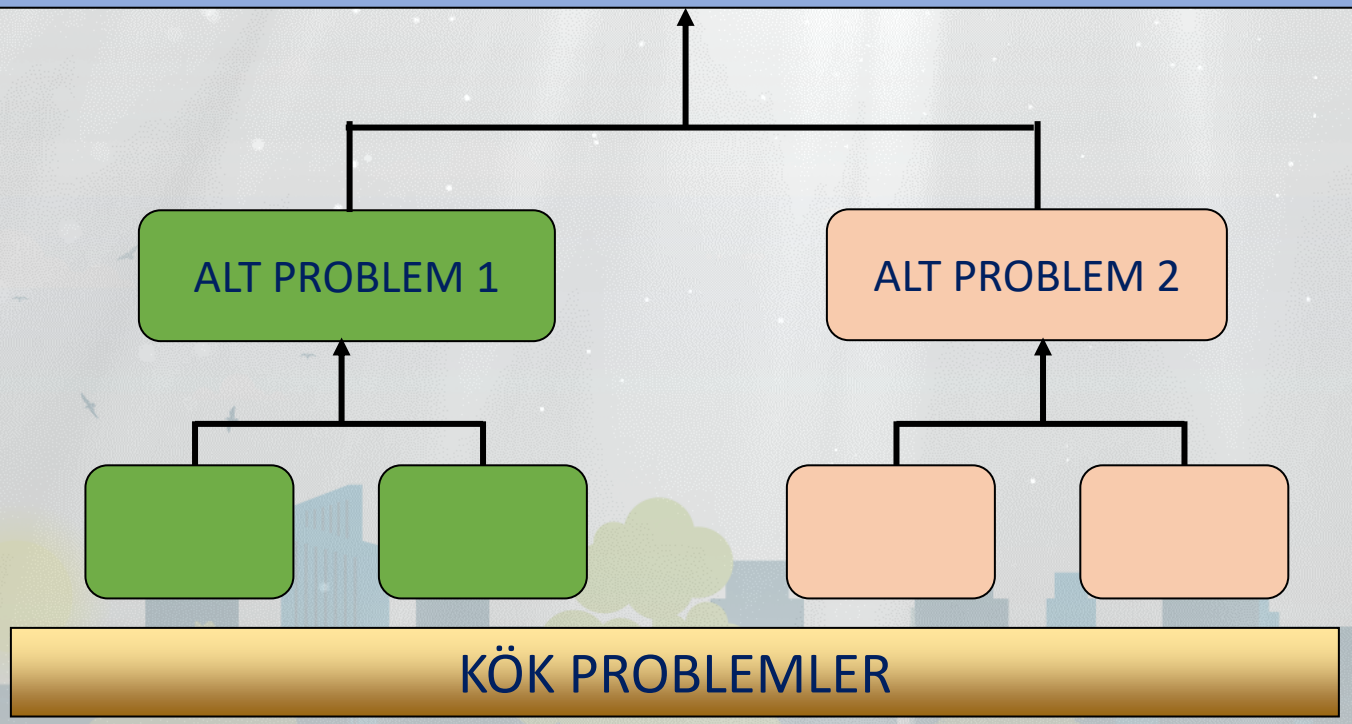

NEDENLER

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

SONUÇLAR

Özel yetenekli öğrenciler erken yaşta sistematik ve planlı bir şekilde tespit edilmiyor

Öğretmenler bu konuda bilgili değil

NEDENLER

KÖK PROBLEMLER

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

SONUÇLAR

Özel yetenekli öğrenciler erken yaşta sistematik ve planlı bir şekilde tespit edilmiyor

Öğretmenler bu konuda bilgili değil

Bilgi sahibi olan öğrt. teknik detaylara hakim değil

NEDENLER

KÖK PROBLEMLER

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

SONUÇLAR

Özel yetenekli öğrenciler erken yaşta sistematik ve planlı bir şekilde tespit edilmiyor

Öğretmenler bu konuda bilgili değil

Bilgi sahibi olan öğrt. teknik detaylara hakim değil

Üniversitelerde öğretmenlere bu teknik eğt. verilmiyor

NEDENLER

KÖK PROBLEMLER

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

SONUÇLAR

Özel yetenekli öğrenciler erken yaşta sistematik ve planlı bir şekilde tespit edilmiyor

Öğretmenler bu konuda bilgili değil

Bilgi sahibi olan öğrt. teknik detaylara hakim değil

Üniversitelerde öğretmenlere bu teknik eğt. verilmiyor

Hizmetiçi eğitimler yeterli seviyede değil

NEDENLER

KÖK PROBLEMLER

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

SONUÇLAR

Özel yetenekli öğrenciler erken yaşta sistematik ve planlı bir şekilde tespit edilmiyor

Öğretmenler bu konuda bilgili değil

Bilgi sahibi olan öğrt. teknik detaylara hakim değil

Üniversitelerde öğretmenlere bu teknik eğt. verilmiyor

Hizmetiçi eğitimler yeterli seviyede değil

İlgili formları nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar

Aralarında bilgi aktarımı yok

NEDENLER

KÖK PROBLEMLER

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

SONUÇLAR

Özel yetenekli öğrenciler erken yaşta sistematik ve planlı bir şekilde tespit edilmiyor

Öğretmenler bu konuda bilgili değil

Bilgi sahibi olan öğrt. teknik detaylara hakim değil

Üniversitelerde öğretmenlere bu teknik eğt. verilmiyor

Hizmetiçi eğitimler yeterli seviyede değil

İlgili formları nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar

Aralarında bilgi aktarımı yok

Eğt. programları güncel değil

NEDENLER

KÖK PROBLEMLER

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

«Sorunu kökünden halletmek»

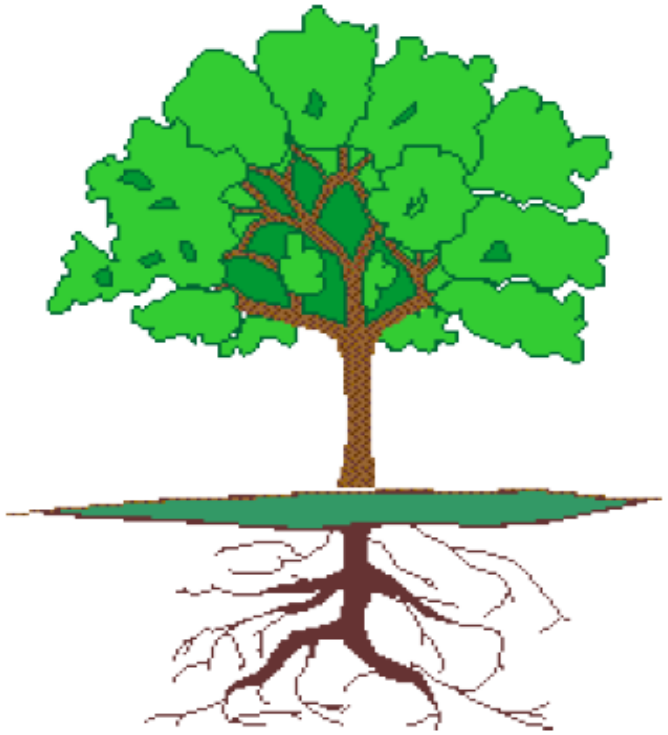

Etkiler/
Sonuçlar

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

«Sorunu kökünden halletmek»

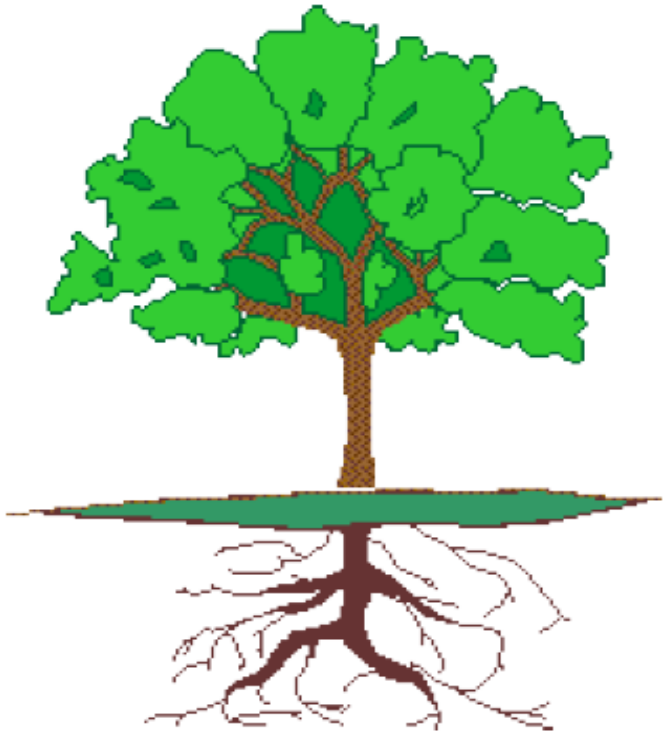

Etkiler/
Sonuçlar

Problemler

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

«Sorunu kökünden halletmek»

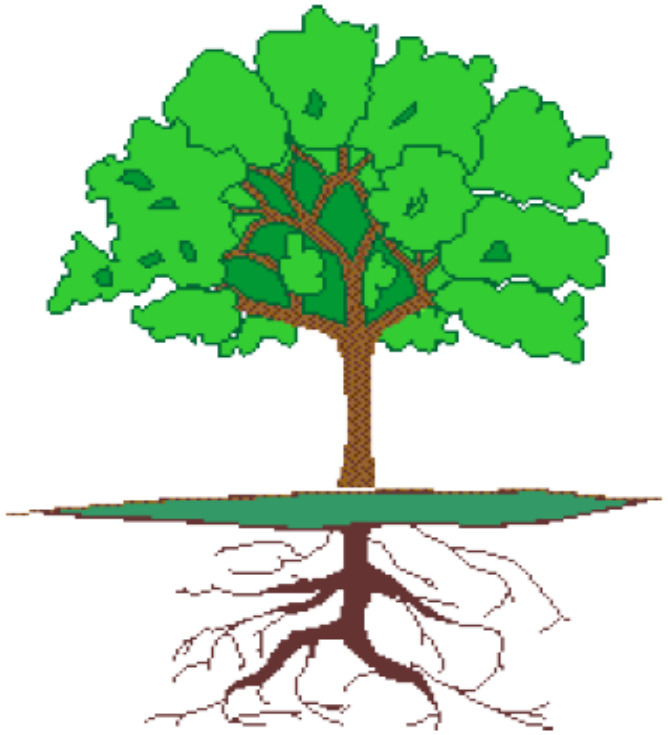

Etkiler/
Sonuçlar

Problemler

Nedenler

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

SORUN ANALİZİ

SONUÇLAR

Özel yetenekli öğrenciler erken yaşta sistematik ve planlı bir şekilde tespit edilmiyor

NEDENLER

Öğretmenler bu konuda bilgili değil

Bilgi sahibi olan öğrt. teknik detaylara hakim değil

Üniversitelerde öğretmenlere bu teknik eğt. verilmiyor

Hizmetiçi eğitimler yeterli seviyede değil

İlgili formları nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar

Aralarında bilgi aktarımı yok

Eğt. programları güncel değil

KÖK PROBLEMLER

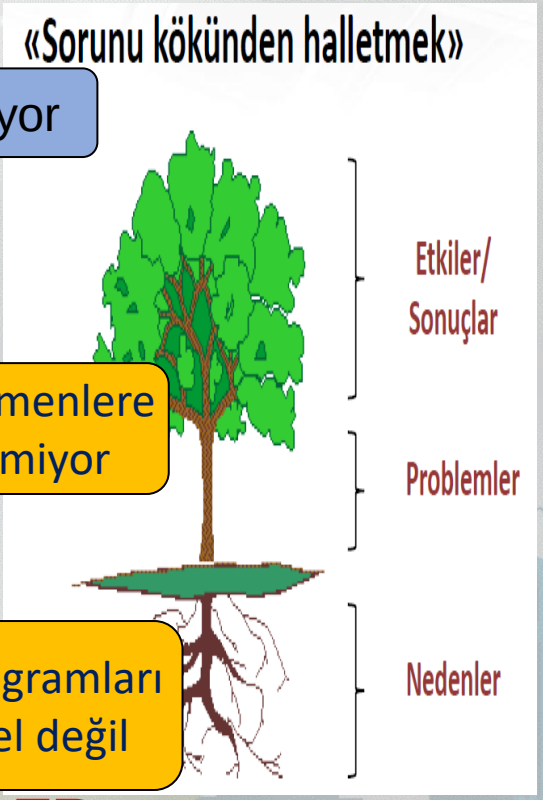

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Projenin Arka Planı ve İlgililiği

Hedef il/bölge/sektöre ilişkin ihtiyaçlar ve/veya sorunlarıyla olan ilgililiği

Hedef il/bölge/sektörün proje öncesi durumu açıkça belirtiniz (mümkünse verileri/sayısal analizleri dahil ediniz).

Proje ile ele alınacak sorunların ayrıntılı bir şekilde belirterek hedef il/bölge/sektör düzeyinde birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu açıklayınız.

Projenin –varsa- ilgili ulusal, bölgesel ve/veya yerel düzeyde gerçekleştirilen planlar/programlar ile ilişkisini ve Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve diğer donörler (Üye Devletler ve diğerleri) tarafından desteklenen diğer girişimlerle tamamlayıcılığını açıklayınız.

Hedef il/bölge/sektöre ilişkin ihtiyaçlar ve/veya sorunlarıyla olan ilgililiği *

BAŞVURU FORMU!!! (SORUN ANALİZİ)

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

İsteğim / Arzu ettiğim / Hayal ettiğim ne?

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

SORUN ANALİZİ

HEDEF ANALİZİ

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

HEDEF AĞACI

AMAÇ

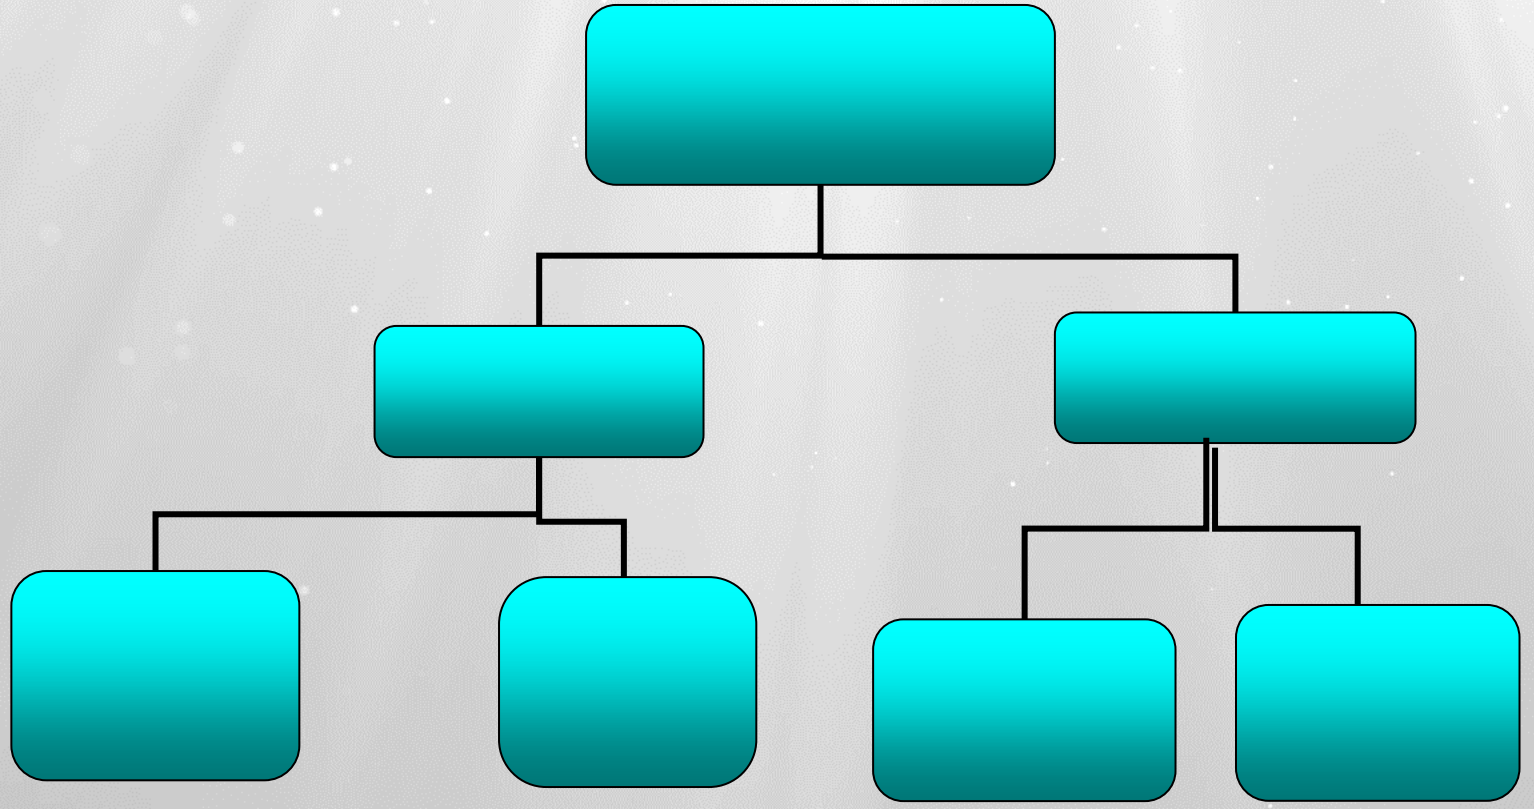

ARAÇ

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

HEDEF ANALİZİ

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

PAYDAŞ ANALİZİ

Bu sorun başka kimin sorunu?

Bu sorunu çözmek için en çok kim katkı sağlar? Kim karşı çıkar?

Bu sorunun çözülmesinden kimler etkilenecek (olumlu – olumsuz)?

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Paydaşların Birbirleri ile Etkileşimi

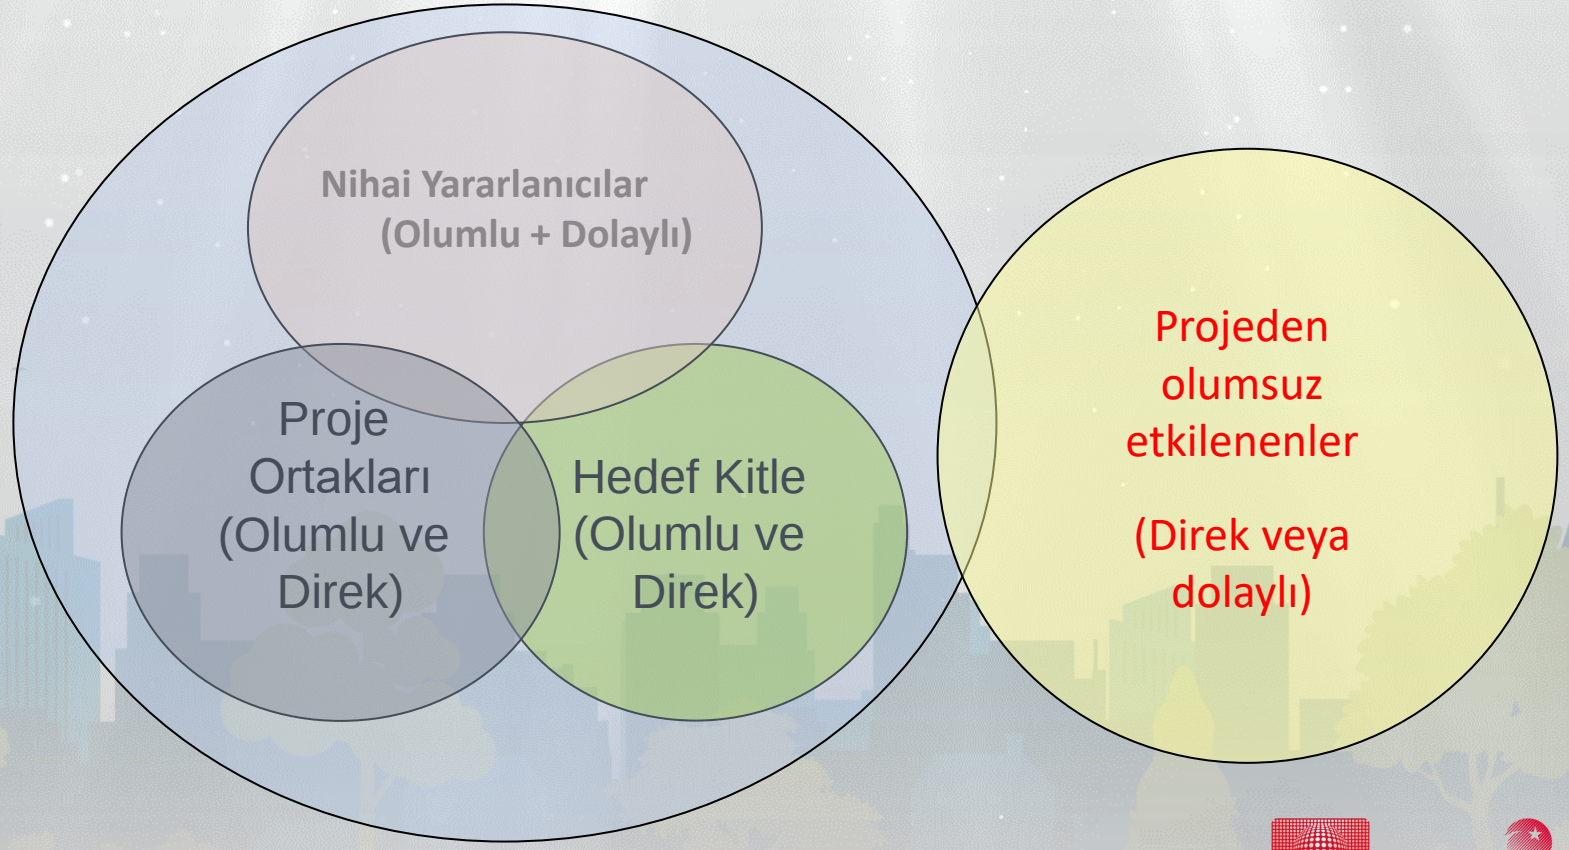

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

PAYDAŞ ANALİZİ --- 4 KAVRAM

1. Hedef kitle: *Projeyi kime uyguladığımız yani üzerinde somut değişiklik yarattığımız kitledir.*
(5 N 1 K ile sayısal veriler ile net tanımlanmalı)

X ili Y mahallesinde görev yapan 80 sınıf öğretmeni

2. Nihai faydalanıcılar: *Projemizden en nihayetinde faydalanacak, olumlu etkilenecek kitlelerdir.*
(5 N 1 K ile sayısal veriler ile net tanımlanmalı)

Branş öğretmenleri, özel yetenekli öğrenciler, veliler

3. Ortaklar: *Projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilen, yaptıkları masraflar başvuru sahibinin yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecek olan kuruluşlardır. (Bu hibe programı kapsamında ortakların satın alma ve ödeme yetkisi yoktur.* ***Bu program için TANIM: Başvuru sahibi ile birlikte projenin hazırlama, uygulama ve yönetimine teknik bakımdan destek olan fakat mali sorumluluğu bulunmayan kurum/kuruluştur.)***

X İl Milli Eğitim Müdürlüğü, (konu özelinde çalışan) STK

4. İştirakçiler: *İştirakçi "desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda,* ***doğrudan fayda veya menfaat elde etmeden*** *yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan (teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık aktarımı vb.) kurum ve/veya ilgili kişi" olarak tanımlanmıştır.*

Rehberlik Araştırma Merkezi, MEB Özel Öğretim Gn. Md.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

- Ortak, iştirakçi, alt yüklenici, hedef gruplar gibi aktörlerin projedeki rollerinin açıkça tanımlanmaması
- Ortaklara yeterince etkin bir rol atfedilmemiş olması, ortaklığın biçimsel düzeyde kalması
- Dış aktörlerin projeye katılımının öngörülmesi durumunda bunu sağlamak için gerekli tedbirlerden bahsedilmemiş olması

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

STRATEJİ ANALİZİ

Hangi yolu/yolları seçiyoruz?

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Strateji Seçiminde Dikkate Alınacak Kriterler

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

3.2. Projenin Arka Planı ve İlgililiği

3.2.1. Hedef il/bölge/sektöre ilişkin ihtiyaçlar ve/veya sorunlarıyla olan ilgililiği (2000 karakter)

Sorun / Hedef Analizi

3.2.2. Hedef gruplar/nihai yararlanıcıların ilgililiği (2500 karakter)

Paydaş Analizi

3.2.3. Hibe Programının hedefleri/öncelikleriyle ilgililiği (2000 karakter)

3.2.4. Katma değer yaratan unsurlar/Kesişen konular ile ilgi düzeyi (2000 karakter)

Hedef Analizi / Arka Plan Okumalar

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

(Bizim) Kurumsal İhtiyaçlarımız / Hedeflerimiz

Programın İhtiyaçları / Hedefleri

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

AMAÇ

Özel yetenekli öğrenciler erken yaşta sistematik ve planlı bir şekilde tespit ediliyor

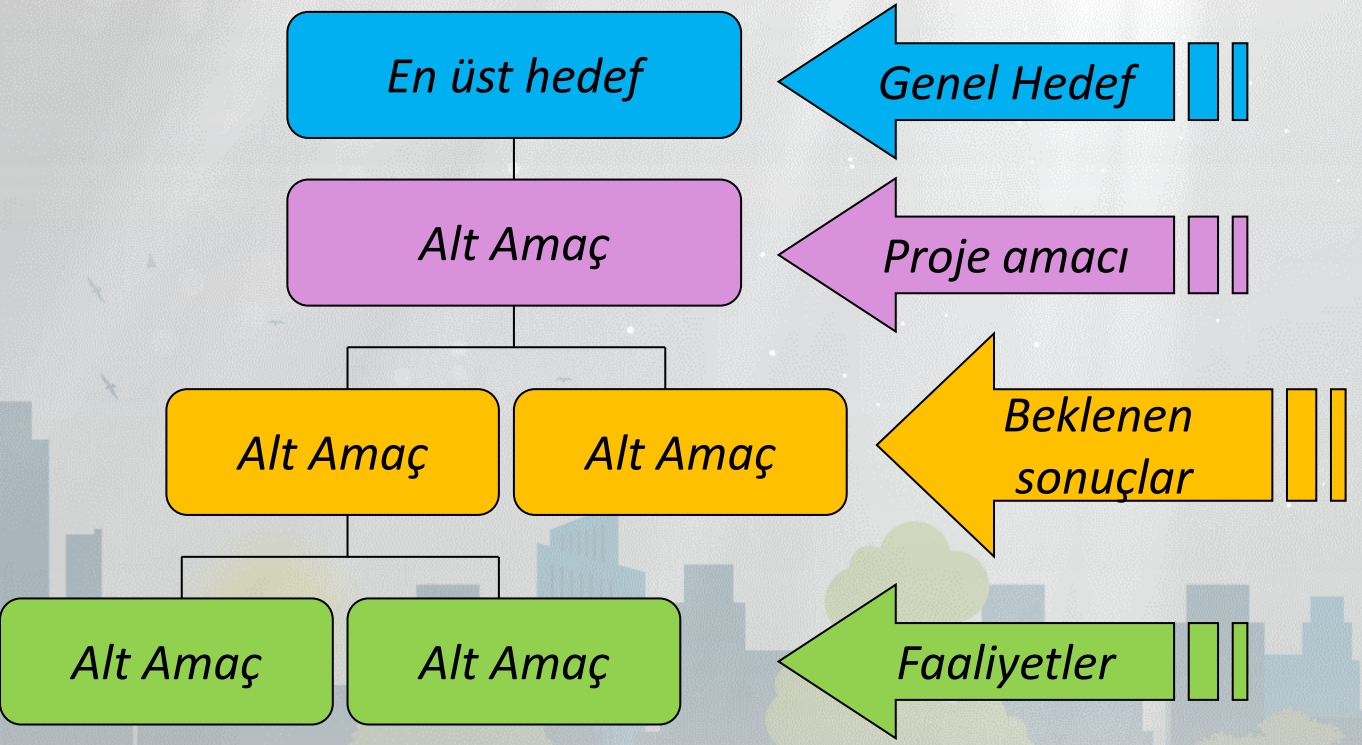

Öğretmenler bu konuda bilgili

Bilgi sahibi olan öğrt. teknik detaylara hakim

Hizmet içi eğitimler yeterli seviyede

İlgili formları nasıl kullanacaklarını biliyorlar

Faaliyet 1.
Eğitim Faaliyetleri

Faaliyet 2.
Saha çalışmaları

Faaliyet 3.

Faaliyet 4.

Faaliyet 5.
Yaygınlaştırma Faaliyetleri

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

3.1. Projenin Hedefi

3.1.1. Projenin Genel Hedefi (500 karakter):

3.1.2. Proje Özel Hedefi (1000 karakter):

3.3.2. Projenin Çıktıları (4000 karakter)

3.3. Projenin Uygulanması

3.3.1. Faaliyetler ve Müdahale Mantığı (20.000 karakter)

Projenin çıktılarına ulaşılmasını sağlayacak faaliyetlerin açıklamasını içermelidir. Faaliyetler açık ve spesifik olmalıdır. Faaliyetler ve proje çıktıları arasındaki ilişkiyi tanımlayınız ve bu faaliyetlerin neden seçildiğini açıklayınız.
Burada yer alan faaliyetler, Ek-6 Faaliyet Planında belirtilmeli ve Ek-3 Gösterge Niteliğinde Bütçe Formu ve Ek-2 mantıksal çerçeve ile uyumlu olmalıdır.

Genel Hedef

Proje amacı

Beklenen sonuçlar

Faaliyetler

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Proje Analizi

1.Mevcut Durum Analizi
2.Sorun Analizi
3.Paydaş Analizi
4.Hedef Analizi
5.Strateji Analizi

Proje Planlaması

1. Faaliyetlerin Planlanması
2. Bütçenin Planlanması
3. Mantıksal Çerçevenin Planlanması

Proje Yazımı

1.Başvuru Formunun Doldurulması
2.Ek Belgelerin Hazırlanması
3.Başvurunun Sunulması

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

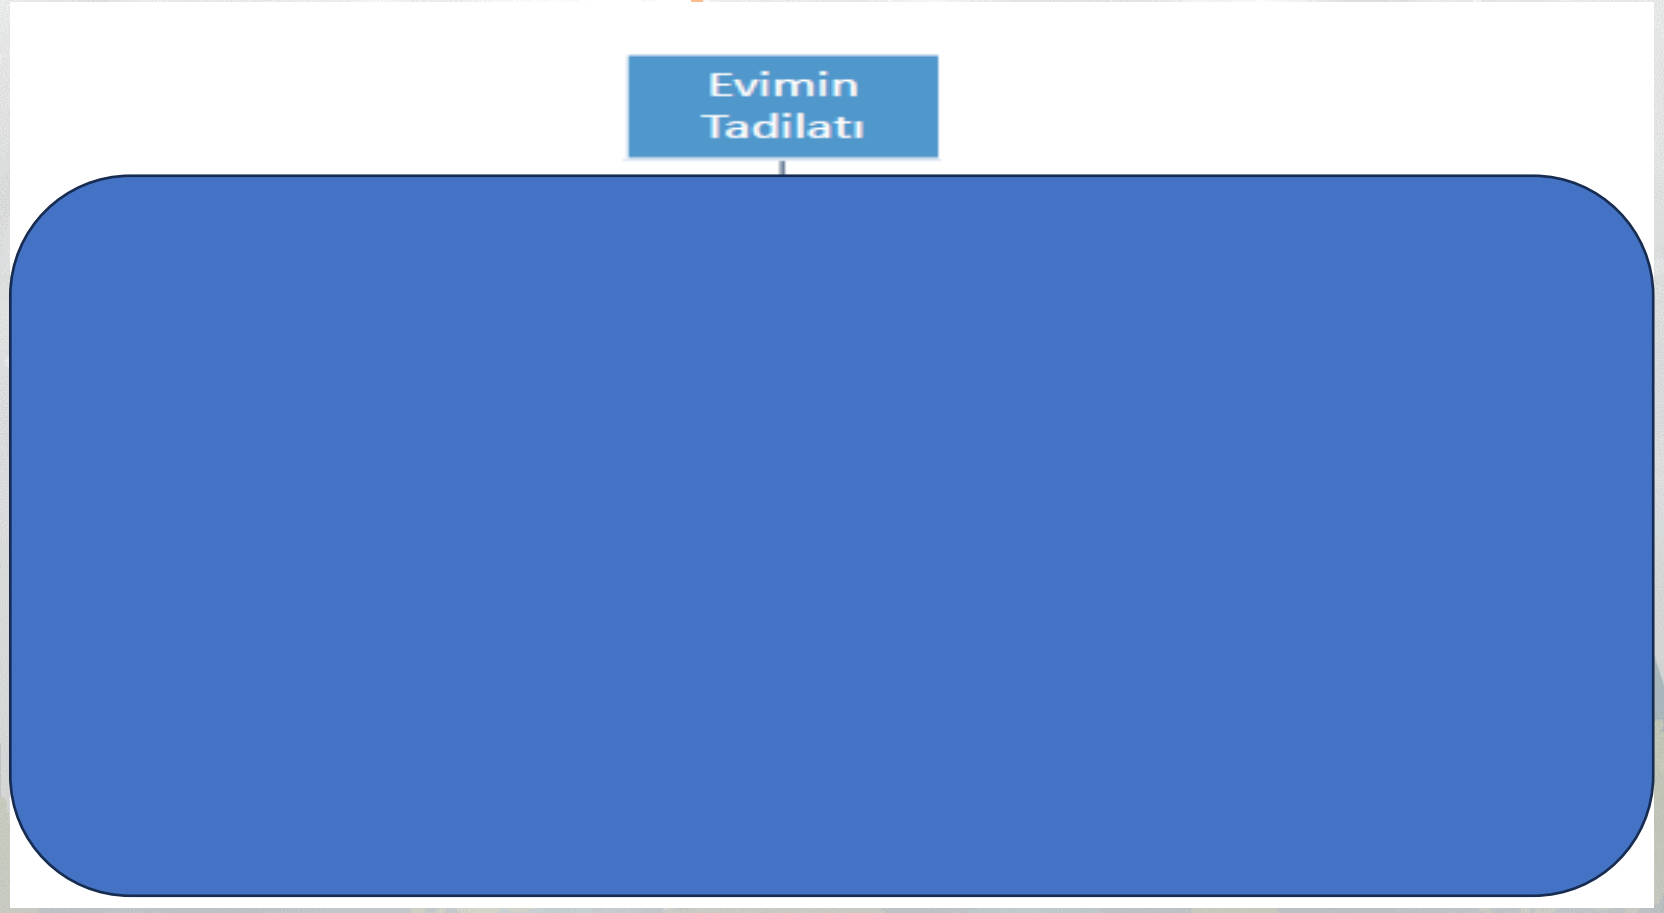

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

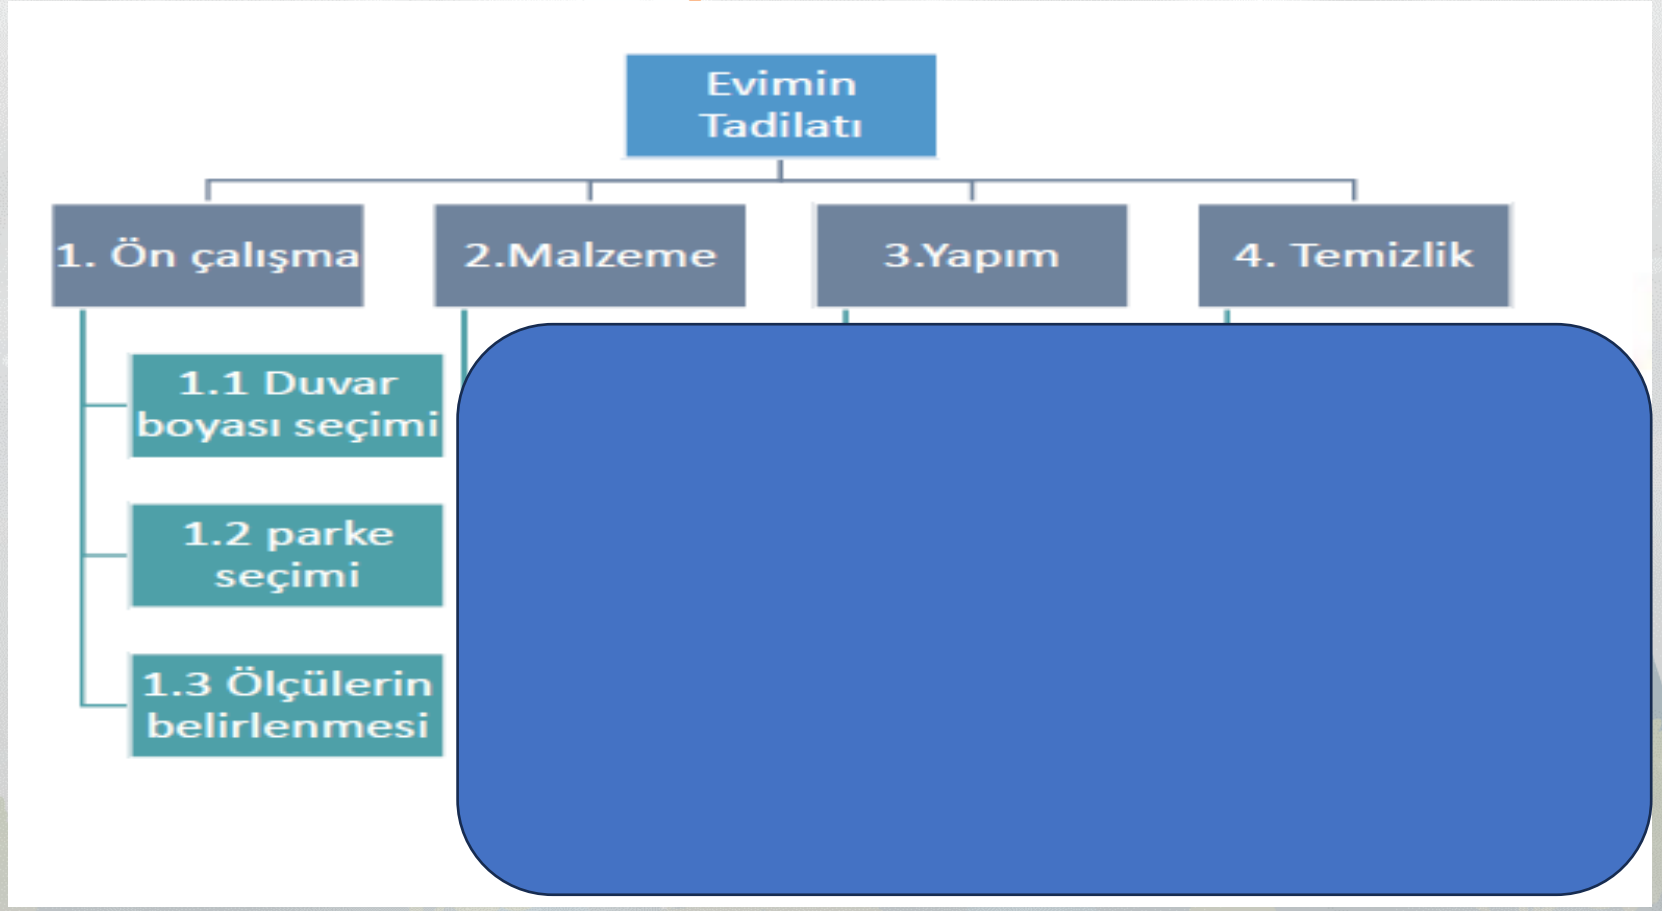

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

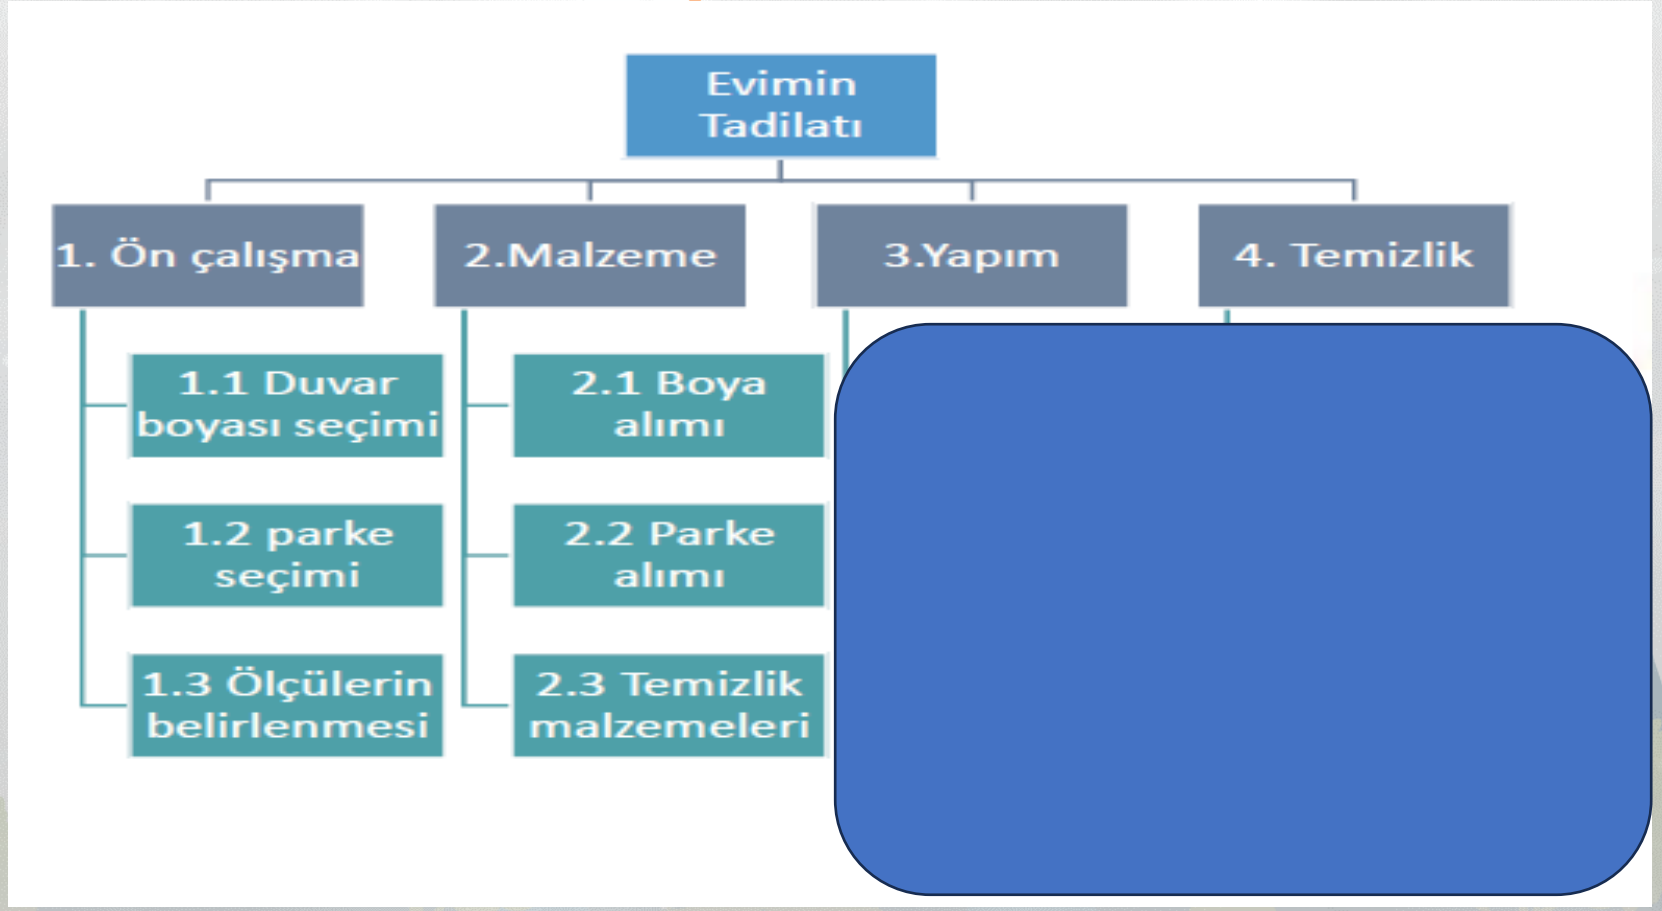

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

İŞİN SÜRECİNİ İYİ PLANLAMAK, DETAYLANDIRMAK ÖNEMLİ…

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Faaliyetlerin Planlanması: Ek - 6

Faaliyet adı	1.ay	2.ay	3.ay	4.ay	5.ay	6.ay	Sorumlu Kurum
1. Eğitim Faaliyetleri	■	■	■	■	■		
1.1 Etkinlik İçeriğinin Belirlenmesi	■						
1.1.1Etkinlik Yerinin Belirlenmesi	■	■					
1.1.2Lojistik Hazırlık Yapılması	■	■					
1.1.3Sunuların Hazırlanması		■					
1.1.4 Katılımcıların belirlenmesi		■					
1.2 Eğitimlerin gerçekleştirilmesi			■	■	■		
1.3 Eğitim değerlendirmesi						■	



Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Faaliyet adı	1.ay	2.ay	3.ay	4.ay	5.ay	6.ay	Sorumlu Kurum
2. Saha Çalışmaları							
2.1							
2.1.1							
2.1.2							
2.1.3							

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Faaliyet adı	1.ay	2.ay	3.ay	4.ay	5.ay	6.ay	Sorumlu Kurum
3.							
3.1							
3.1.1							
3.1.2							
3.1.3							

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Faaliyet adı	1.ay	2.ay	3.ay	4.ay	5.ay	6.ay	Sorumlu Kurum
4.							
4.1							
4.1.1							
4.1.2							
4.1.3							

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Faaliyet adı	1.ay	2.ay	3.ay	4.ay	5.ay	6.ay	Sorumlu Kurum
5. Yaygınlaştırma Faaliyetleri							
5.1							
5.1.1							
5.1.2							
5.1.3							

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Bütçenin Planlanması: Ek-3

Bütçe Bileşenleri

1. İnsan Kaynakları
2. Ulaşım
3. Ofis Giderleri
6. Diğer Malzeme
5. Ekipman / Malzeme
4. Hizmet Alım Sözleşmeleri



Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Genel Gider Kategorileri	Birim (ay, saat, km, adet, uçuş, harcırah vb.)	Birim Sayısı	Birim Fiyatı (Dolar)	Toplam Fiyat (Dolar)
İnsan kaynakları				
1.1 Maaşlar-yerel personel				
1.1.1 Teknik	Aylık	4	500	2000
1.1.2. İdari/destek personel				
1.2 Maaşlar-yabancı personel				
1.3 Seyahat ve görev için harcırah				
1.3.1. Yurtdışı (görevli personel)				
1.3.2. Yurtiçi (görevli personel)				
1.3.3. Seminer/konferans katılımcıları				
1. İnsan Kaynakları Ara Toplamı				
Ulaşım				
2.1 Uluslararası ulaşım giderleri				
2.2 Yurt içi ulaşım giderleri				
2. Ulaşım Giderleri Ara Toplamı				
Ofis				
3.1 Ofis kirası				
3.2 Sarf malzemeleri-ofis malzemeleri				

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Genel Gider Kategorileri	Giderlere İlişkin Açıklama Önerilen giderlerin gerekliliğini ve bunların proje ile ilişkisini gösteren (örneğin, faaliyetlere ve/veya sonuçlara yapılan atıflar aracılığıyla) her bir bütçe kaleminin açıklayıcı bir açıklamasını sağlayın.	Tahmini Maliyete İlişkin Gerekçe Tahmini maliyetlerin hesaplanmasının gerekçesini belirtin. Tahminin gerçek maliyetlere dayanması gerektiğini unutmayınız.
İnsan kaynakları		
1.1 Maaşlar-yerel personel	Açıklaması yapılacak	Maliyetin Gerekçesi Yazılacak
1.1.1 Teknik		
1.1.2. İdari/destek personel		
1.2 Maaşlar-yabancı personel		
1.3 Seyahat ve görev için harcırah		
1.3.1. Yurtdışı (görevli personel)		
1.3.2. Yurtiçi (görevli personel)		
1.3.3. Seminer/konferans katılımcıları		
1. İnsan Kaynakları Ara Toplamı		
Ulaşım		
2.1 Uluslararası ulaşım giderleri		
2.2 Yurt içi ulaşım giderleri		
2. Ulaşım Giderleri Ara Toplamı		
Ofis		
3.1 Ofis kirası		
3.2 Sarf malzemeleri-ofis malzemeleri		



Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Bütçe kurallarına ilişkin Program Rehberi (Bölüm 3)

ve ilgili dokümanları **mutlaka** inceleyiniz.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Bütçe yazılmasında 2 yöntem vardır:

1- Birim Maliyet

Tanımlanabilen, rahatlıkla ölçülebilen, raftan alınabilecek ürünler, aylık personel ödemeleri, uzman, adam/günleri; birim değerleri X adetleri çarpılarak bulunur

2- Götürü Bedel

Raftan alınamayan hizmet sözleşmleri için, çıktı odaklı maliyet belirleme, Strateji Hazırlanması, Analiz Raporu vb. işler için kullanılır.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

MANTIKSAL ÇERÇEVE -------- Ek-2

Hedefi belirledik.

Stratejiyi belirledik.

Faaliyetleri tasarladık.

Faaliyetleri göstergelere dönüştürebilir miyiz?

Göstergeleri objektif olarak ölçebilir miyiz?

Bu faaliyetler için varsayımlarımız / risklerimiz var mı?

Faaliyetler için (gösterge) bugün ne durumdayız? Neyi hedefliyoruz?

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Mantıksal Çerçeve

Özel yetenekli öğrenciler erken yaşta sistematik ve planlı bir şekilde tespit ediliyor

Öğretmenler bu konuda bilgili

Bilgi sahibi olan öğrt. teknik detaylara hakim

Hizmet içi eğitimler yeterli seviyede

İlgili formları nasıl kullanacaklarını biliyorlar

Faaliyet 1.
Eğitim Faaliyetleri

Faaliyet 2.
Saha çalışmaları

Faaliyet 3.

Faaliyet 4.

Faaliyet 5.
Yaygınlaştırma Faaliyetleri

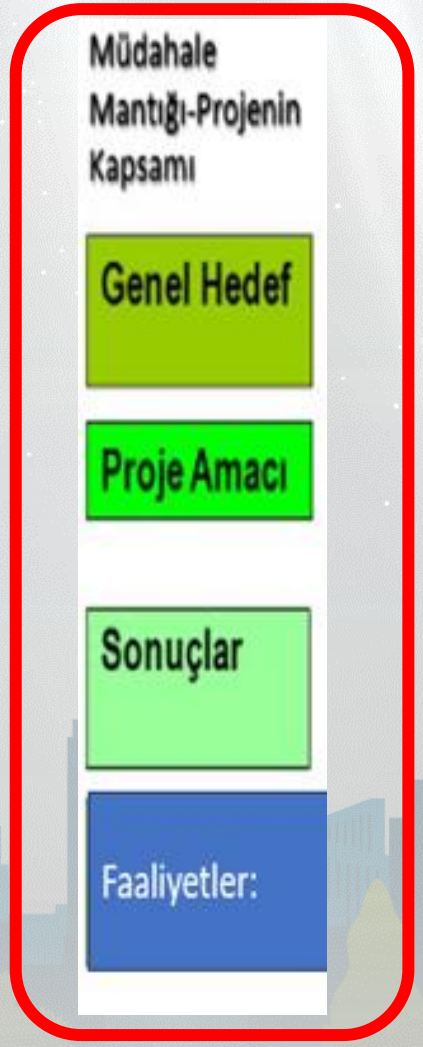

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

GİRDİ	FAALİYET	SONUÇ	KISA / ORTA VADELİ ETKİ (PROJE AMACI)	UZUN VADELİ ETKİ (GENEL HEDEF)
Mali girdi (Hibe Alınması)	Öğretmen eğitimi	Öğretmenler eğitildi	Eğitimli öğretmen sayısı %15 arttı	… konusunda bilgi seviyesi %2 arttı

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Müdahale Mantığı-Projenin Kapsamı	Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler	Referans Değer	Hedef Değer	Mevcut Değer	Doğrulama Kaynakları	Varsayımlar
Genel Hedef		Müdahalenin ilerlemesinin değerlendirilebileceği veya karşılaştırılabileceği müdahaleden önceki göstergelerin değeri	Göstergelerin hedeflenen nihai değeri	Raporlama sırasında göstergelerin mevcut en son değeri		
Proje Amacı						
Sonuçlar						
Faaliyetler:		Araçlar: Giderler:				

Analizler sırasında elde ettiklerimiz (Sol sütun)

Proje yönetim kontrolü dışındaki faaliyetler-çıktılar bağlantısını etkileyebilecek faktörler

Varsayım, söz konusu sürecin başlaması için olacağı varsayılan işler.

İlgili faaliyetin, sonucun başarısını ölçmek için basit ve güvenilir bir ortalama sağlayan nicel ve / veya nitel değişken veriler, kaynaklar

Cinsiyete göre ayrıştırılmış veri

Mevcut, referans ve hedef değerler ile «ölçebilme ve değerlendirebilme»

Önkoşul, proje faaliyetlerinin başlamasından önce yerine getirilmesi gereken bir şart olması bakımından, varsayımdan farklıdır. (izinler-finansal destek vb.)

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Önkoşul: Projeye başlayabilmek için olmazsa olmaz koşuldur. Faaliyetlere başlamadan önce olması gerekir. Her projede olmak zorunda değildir.

Hali hazırda inşaatı devam eden bir binanın iç tasarımını proje ile yapacaksak, inşaatın bitmiş olması projeye başlamak için ön koşulumuzdur.

Riskler: Ortaya çıkması durumunda, projenin başarısını etkileyecek DIŞSAL koşullar.

Varsayım: Genelde riskin olumlu cümleye çevrilmiş versiyonudur. Varsayımları da düşünmemiz gerekir, aksi projenin başarısını etkiler.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Gösterge: Elde etmek istediğiniz uzun-orta ve kısa vadede sonuçlara ne düzeyde ulaştığınızı ölçebilmeniz için belirlediğiniz ölçülebilir ve nesne değişkenler. Belirlenen göstergeler spesifik, ölçülebilir, erişilebilir, ilgi ve zamana bağlı (SMART) olmalıdır.

Baseline (Temel Değer): Projede belirlenen göstergelerin proje uygulaması başlamadan önceki («0» zamanındaki) başlangıç değerlerini belirtir.

Current Value (Mevcut Değer): Projede belli bir aşama kaydedildikten sonra göstergelerde meydana gelen gelişmeler güncel değerlerle takip edilir. Mantıksal çerçeve matrisinde yer alan bu sütun raporlama dönemlerinde kullanılır.

Target (Hedef Değeer): Proje süresinin sonunda göstergelerde erişmeyi hedeflemediğimiz değerleri ifade eder.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Mantıksal Çerçeve Matrisindeki temel cümleler aşağıdan yukarıya doğru;

•Eğer ……. Faaliyetini gerçekleştirirsem ve …… varsayımlarım doğruysa ……. sonucuna ulaşırım.

•Eğer ……. Sonucuna ulaşırsam ve …… varsayımlarım doğruysa …… özel hedefine ulaşırım

•Eğer ……. Hedefine ulaşırsam ve …… varsayımlarım doğruysa …… olan genel hedefime ulaşırım

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Örnek Müdahele Mantığı ve Yazımı

Varsy.	Bisiklet Derneklerinin proje faaliyetlerine katılacağı ve Belediye yönetiminin bisiklet yolu açma istekliliğinin varlığı varsayımı ile
Faaliyet	Bisiklet yol güzergahı çalıştayları tamamalandığında ve belediye çalışanlarına eğitimler verildiğinde ve yerel halkı bilgilendirme toplantıları yapıldığında
Riskler	Bölge esnafının bisiklet yoluna olacak tepkisi ve belediye meclisinde bisiklet yollarının yapımı onayları riskleri belediye tarafından yönetildiğinde
Çıktılar	Yol güzergah analizleri planı tamamlanmış Genel Halkın bisiklet yolu hakkında farkındalığı artmış
Ö. Hedef	Tüm tarafların mutabık kaldığı bisiklet yolları tamamlanmış
G. Hedef	Yollarımız bisikletliler için daha güvenli olmuş olacak

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

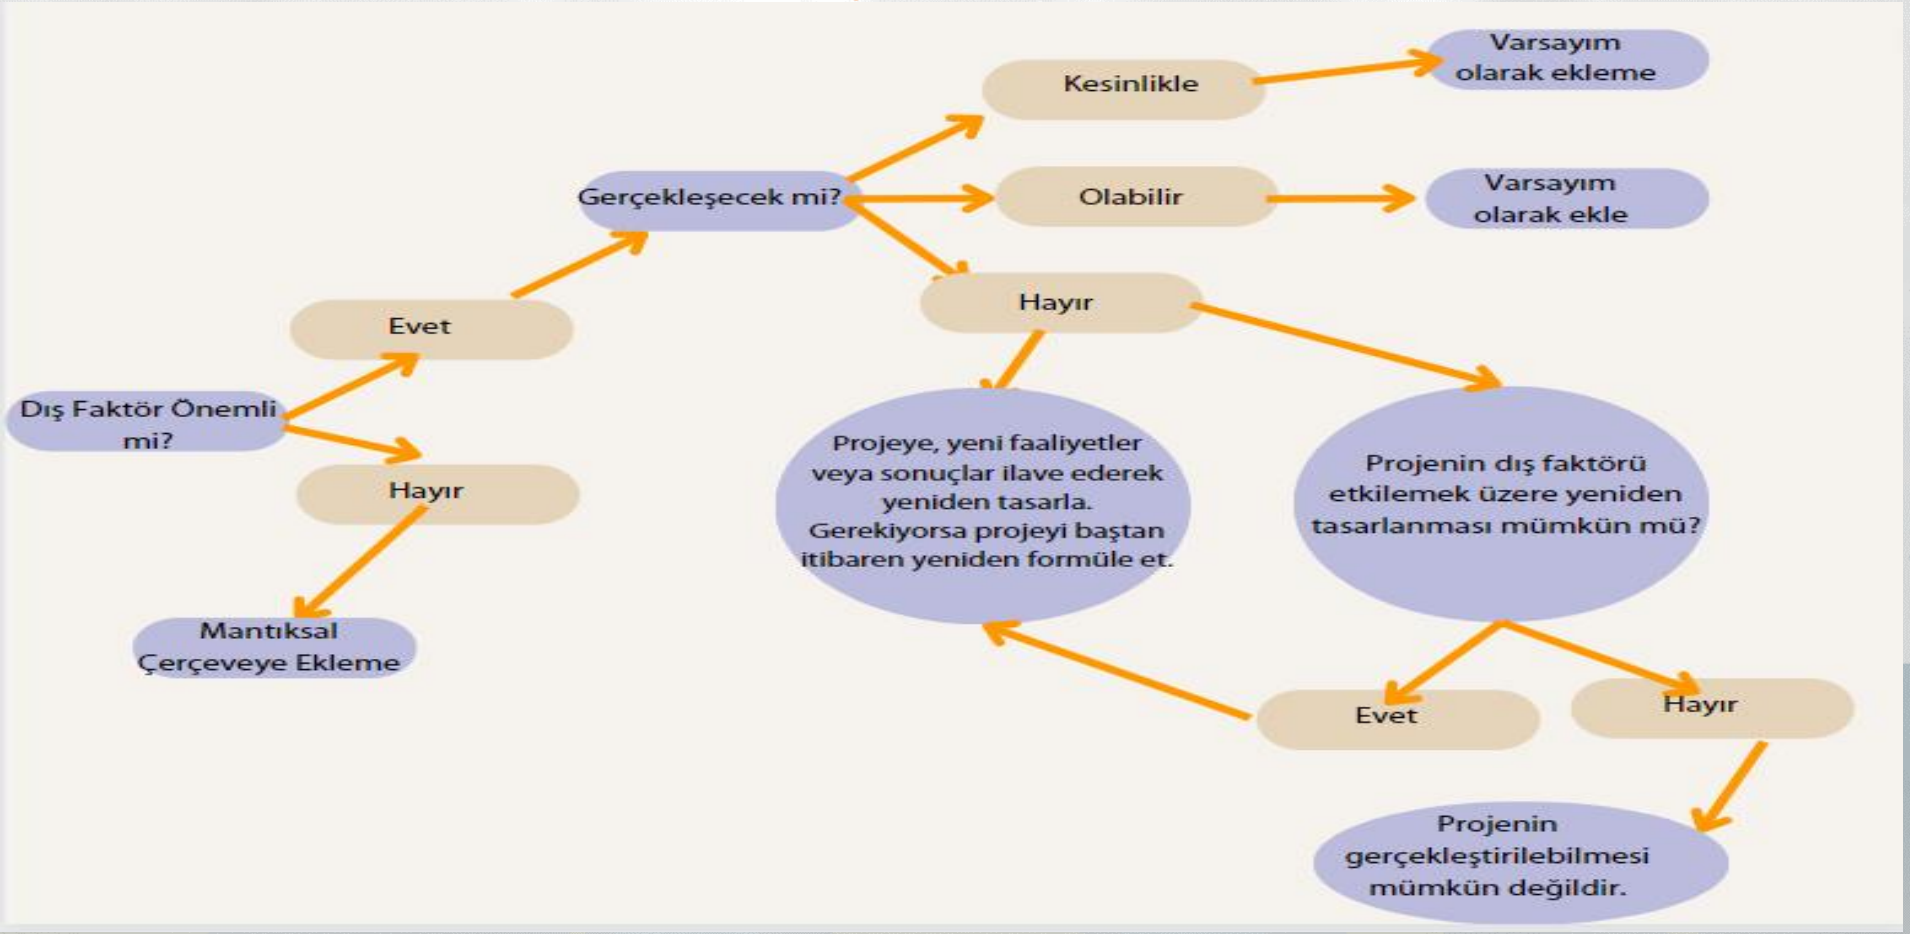

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Müdahale Mantığı-Projenin Kapsamı	Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler	Referans Değer	Hedef Değer	Mevcut Değer	Doğrulama Kaynakları	Varsayımlar
Genel Hedef		Müdahalenin ilerlemesinin değerlendirilebileceği veya karşılaştırılabileceği **müdahaleden önceki** göstergelerin değeri	Göstergelerin hedeflenen nihai değeri	Raporlama sırasında göstergelerin mevcut en son değeri		
Proje Amacı						
Sonuçlar						
Faaliyetler:		Araçlar: Giderler:				

Proje Kapsamı (Müdahale Mantığı)	Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler	Başlangıç Değer	Hedef Değer	Güncel Değer	Doğrulama Kaynakları	Varsayımlar
GENEL HEDEF: Özel yetenekli öğrencilerin erken yaşta sistematik ve planlı bir şekilde tespit edilmesini sağlamak.	Tespit Edilen Öğrenci Sayısı: 50	İdeal olarak diğer paydaşların stratejilerinden elde edilmeli		İdeal olarak diğer paydaşların stratejilerinden elde edilmeli	Diğer ortakların stratejilerinden elde edilmeli	
PROJE AMACI: 1.Özel yetenekli öğrencileri tespit edebilmek için sınıf öğretmenlerinin mesleki yeterliklerinin geliştirilmesini sağlamak.	Yetenek gözlem ve kontrol formunun doldurulması ve özel yetenekli öğrencileri belirlemeye katkı sağlayacak Mantıksal Tasarım ve Algoritma Oluşturma Eğitimlerine katılan sınıf öğretmeni sayısı:80	Ilk 6 ay «10» Ikinci 6 ay "80"	15 ay sonu:80	2025 sonuna kadar «…» (Ara rapor dönemi)	İl Müdürlüğü Raporları,	Proje başvuru sahibi ve ortaklarının uygulama süreçlerini hassasiyetle yürütmeleri, -İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitim izni vermesi
SONUÇLAR (Çıktılar) 1.3Sınıf öğretmenlerinin özel yetenekli öğrencileri (ÖYÖ) tespit etme yeterliklerinin artırılması,	Özel yetenekli öğrencileri tespit etme yeterlikleri artırılan Sınıf öğretmeni sayısı:80,	5 öğretmen	15 ay sonu:80	2025 sonuna kadar «…» (Ara rapor dönemi)	Tutanaklar, kayıtlar, sertifikalar vb.	Öğretmenler eğitimlerde istekli ve aktif katılımcı

Faaliyetler:

1.Faaliyet Grubu:
2.Faaliyet Grubu:
1.3.3.Faaliyet Grubu: Eğitim Faaliyetleri
1.3.3.1 Sınıf öğretmenleri için Mantıksal Tasarım ve Algoritma Oluşturma hizmet içi eğitim içeriği pilot eğitimi
1.3.3.2 Yetenek gözlem ve kontrol formunun doldurulması eğitimi
1.3.3. 3 Üniversite için Mantıksal Tasarım ve Algoritma Oluşturma eğitimi
1.3.3.4 Üstün yetenekli öğrenci velileri eğitimi

Araçlar:

3.1 Sınıf öğretmenleri için Mantıksal Tasarım ve Algoritma Oluşturma hizmet içi eğitim içeriği, eğitim programı, bilgisayar, projeksiyon cihazı, katılımcı listesi, eğitimci görevlendirme yazıları ve ücretleri, eğitim mekanı ve ikram ücretleri.

A3.2 Yetenek gözlem ve kontrol formunun doldurulması eğitimi için eğitim programı, bilgisayar, projeksiyon cihazı, katılımcı listesi, eğitimci görevlendirme yazıları ve ücretleri, eğitim mekanı ve ikram ücretleri.

Giderler:

İnsan Kaynağı 52.450,00 $
Seyahat 7.200,00 $
Ekipman 13.160,00 $
Ofis 0,00 $
Toplam Gider 72.810,00 $

İl Milli ve Eğitim Müdürlüğü ve üniversite proje çalışmalarına destek sağlayacaktır.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Proje Analizi

1.Mevcut Durum Analizi
2.Sorun Analizi
3.Paydaş Analizi
4.Hedef Analizi
5.Strateji Analizi

Proje Planlaması

1. Faaliyetlerin Planlanması
2. Bütçenin Planlanması
3. Mantıksal Çerçevenin Planlanması

Proje Yazımı

1.Başvuru Formunun Doldurulması
2.Ek Belgelerin Hazırlanması
3.Başvurunun Sunulması



Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Puanlama:

Değerlendirme kriterleri bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki esaslara göre 1 ile 5 arasında bir puan verilecektir: 1=çok zayıf, 2=zayıf, 3=yeterli, 4=iyi, 5=çok iyi.

Tablo 5: Değerlendirme Tablosu

Bölüm	Azami puan
1. Mali ve Operasyonel Kapasite	**20**
1.1 Başvuru sahibi ve ortak(lar) proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi?	5
1.2 Başvuru sahibi ve ortak(lar) proje konusunda yeterli kurum içi teknik uzmanlığa sahip mi? (özellikle ele alınacak konular hakkında yeterli bilgileri var mı?)	5
1.3 Başvuru sahibi yeterli kurum içi yönetim kapasitesine sahip mi? (personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dâhil olmak üzere)	5
1.4 Başvuru sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi?	5
2. Projenin ilgililiği	**20**
2.1 Proje, teklif çağrısının hedefleri ve öncelikleri ile belirli tema/sektör/alanları veya başvuru rehberinde belirtilen diğer özel şartlarla ne kadar ilgilidir? Beklenen sonuçlar başvuru rehberinde yer alan önceliklerle uyumlu mudur?	5
2.2 Proje, hedef bölge(ler)in veya sektör(ler)in ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgilidir (tekrardan kaçınmak ve diğer kalkınma programları ile sinerji oluşturmak da dahil olmak üzere)?	5
2.3 İlgili taraflar (nihai faydalanıcılar, hedef gruplar) ne kadar açıkça tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiştir? İlgili tarafların ihtiyaçları net bir şekilde belirlenmiş mi ve proje gereksinimleri uygun biçimde ele alıyor mu?	5
2.4 Teklif, katma değer yaratan unsurları ve keşisen konuları (yenilikçilik, iyi uygulamalar vb.) içeriyor mu?	5
3. Proje tasarımı	**15**
3.1 Tasarım, problemlerin detaylı analizini ve ilgili paydaşların kapasitelerini yansıtıyor mu?	5
3.2 Projenin tasarımı ne kadar tutarlı? Teklif proje ile ulaşılması beklenen sonuçları içeriyor mu? Müdahale mantığı ulaşılacak beklenen sonuçlara ilişkin gerekçeyi açıklıyor mu? Teklif edilen faaliyetler uygun, uygulanabilir öngörülen çıktı ve sonuçlarla tutarlı mı?	5
3.3 Teklif/mantıksal çerçeve güvenilir temel ve hedef göstergeler ve doğrulama kaynakları içeriyor mu? İçermiyorsa, temel çalışma öngörülüyor mu (ve bu çalışma teklifte uygun şekilde bütçelenmiş mi)?	5
4. Uygulama yaklaşımı	**15**
4.1 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir mi? Zamanlama gerçekçi mi?	5
4.2 Teklif etkili ve verimli bir izleme sistemi içeriyor mu? Planlanan bir değerlendirme var mı (uygulama öncesinde, esnasında ve/veya sonunda)? Projenin riskleri uygun biçimde belirlenmiş mi?	5
4.3 Projenin yönetim modeli açık bir biçimde belirlenmiş ve ortak(lar)ın ve diğer iştirakçi(ler)nin (varsa) katılım ve katılım düzeyleri açıkça tanımlanmış mı?	5
5. Projenin Sürdürülebilirliği	**15**
5.1 Projenin hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olası mı?	5
5.2 Projenin önceki projelerin sonuçlarını pekiştirmesi, yaygınlaştırması veya deneyim ve bilgi paylaşımına ilişkin yaygınlaştırma kapsamında çarpan etkileri olası mı ve planlanan görünürlük faaliyetleri tutarlı mı? (proje sonuçlarının yinelenmesi ve daha geniş alanları etkilemesi ile bilginin duyurulması dâhil olmak üzere)	5
5.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi? - mali açıdan (örneğin devam eden faaliyetler, işletme ve bakım maliyetlerini karşılayacak gelir kaynakları finansmanı) - kurumsal açıdan (faaliyetlerin devam ettirilmesine imkân tanıyan yapılar proje sonunda da devam edecek mi? Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek mi?) - politika düzeyinde (eğer varsa) (projenin yapısal etkisi ne olacaktır - örneğin mevzuatta, davranış kurallarında, yöntemlerde vb. bir iyileşme sağlayacak mı?) - çevresel (eğer varsa) (projenin çevreye olumlu/olumsuz etkileri olacak mı?)	5
6. Projenin Bütçe ve Maliyet Etkinliği	**15**
6.1 Faaliyetler bütçeye uygun olarak yansıtılmış mı?	5
6.2 Tahmini maliyetler ve beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli mi?	10
Toplam Puan	**100**

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Ek-1: Sivil Katılım Hibe Programı Başvuru Formu



Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL KATILIM PROJESİ

Kayıt Süreci Devam Eden Etkinlikler

Güncel etkinliklerimize ilişkin duyurularımızı buradan takip edebilirsiniz.

14 Kasım 2023	Sivil Katılım Hibe Programı - Çevrimiçi Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi	Zoom Kayıt Formu
15 Kasım 2023	Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Temelli Yaklaşım Bilgilendirme Oturumu	Zoom Kayıt Formu
16 Kasım 2023	Sivil Katılım Hibe Programı - Çevrimiçi Sivil Katılım ve İş Birliği Eğitimi	Zoom Kayıt Formu

TBB Türkiye Belediyeler Birliği

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

UNDP



Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

İŞBİRLİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Bu sunum Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu sunumun içeriği yalnızca UNDP Türkiye sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
